

PLANTA SC.1 e SC.2 (2x) - FORMA

ESCALA: 1 : 25

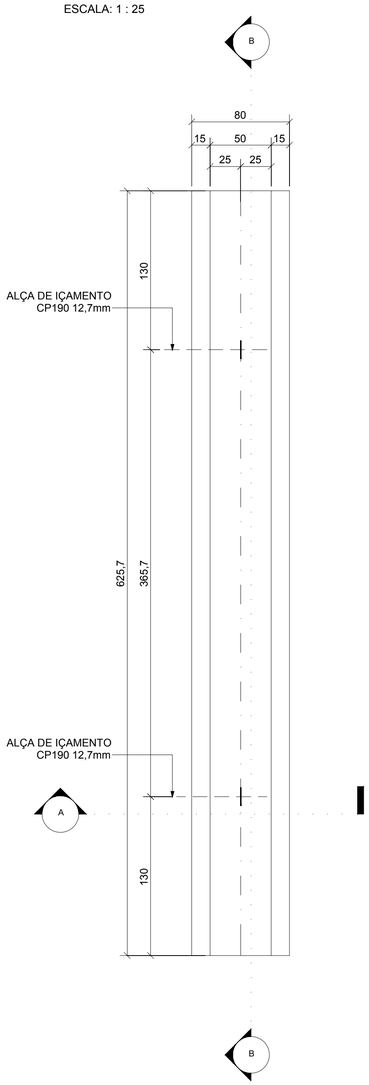


DET. ALÇA DE IÇAMENTO

ESCALA: 1 : 25



CORTE A


ESCALA: 1 : 20



QUANTIDADES SC.1 e SC.2		
MATERIAL	QUANT.(1x)	QUANT.(2x)
CONCRETO ESTRUTURAL (m³)	2,6	5,2
ÁREA DE FORMAS (m²)	9,6	19,2


CORTE B

ESCALA: 1 : 25



SC1 e SC2- ARMADURAS

ESCALA: 1 : 25

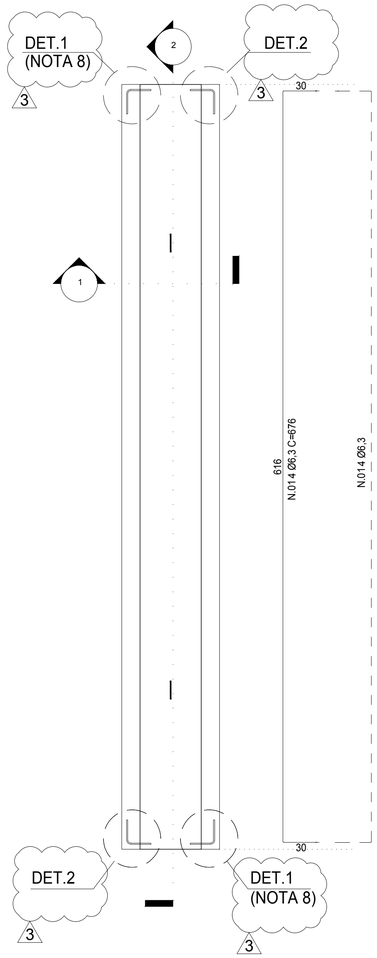


LISTA DE BARRAS (PARA 1 SC)				
N.	Ø (mm)	QUANT. (UNID)	COMPR.UNIT (cm)	COMPR. TOTAL (cm)
01	6,3	8	676	5408
02	8	84	96	8064
03	6,3	6	638	3828
04	8	42	226	9492
05	10	7	698	4886
06	6,3	4	638	2552
07	10	7	698	4886

RESUMO DE AÇO (PARA 1 SC)				
AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO UNIT. (kg/m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	117,9	0,245	29
CA-50	8	175,6	0,395	69
CA-50	10	97,7	0,617	60
TOTAL		391,2		159

RESUMO DE AÇO (PARA 2 SC)				
AÇO	Ø (mm)	COMPR. (m)	PESO UNIT. (kg/m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	235,8	0,245	58
CA-50	8	351,1	0,395	139
CA-50	10	195,4	0,617	121
TOTAL		782,3		317


CORTE 1

ESCALA: 1 : 20



CORTE 2

ESCALA: 1 : 25

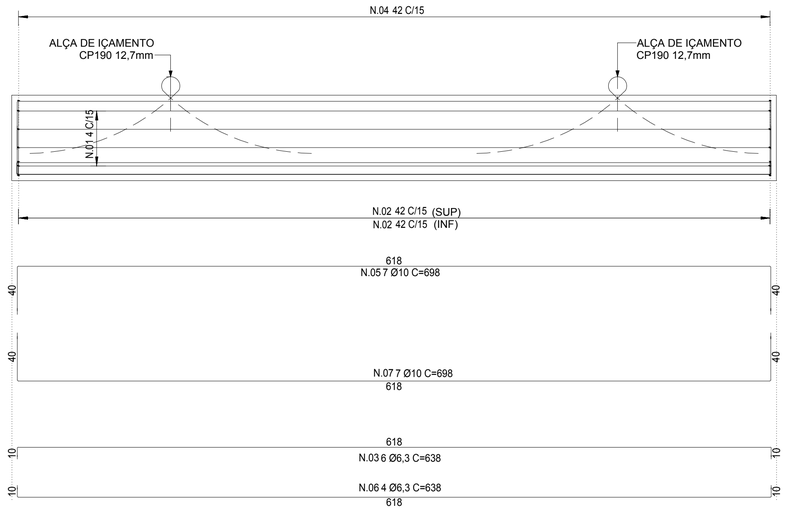


ATERRAMENTO DA FUNDAÇÃO


TABELA DE BARRAS				
POS.	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT.(cm)	TOTAL (cm)
A1	10	8	40	320

RESUMO AÇO CA-50			
Ø	COMPRIMENTO (m)	PESO (Kg/m)	MASSA (Kg)
10	3,2	0,617	2,0
TOTAL			2,0

DETALHE 1 - PLANTA - ATERRAMENTO



DETALHE 2 - PLANTA - ATERRAMENTO



3

NOTAS FL.02

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E BITOLAS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - AÇO CA-50 fyk≥500 MPa.

3 - COBRIMENTO 4,0 cm.

4 - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

5 - APÓS O ASSENTAMENTO DA SAPATA PRÉ-MOLD. NO SEU LOCAL DEFINITIVO, AS ALÇAS DEVERÃO SER CORTADAS.

6 - O IÇAMENTO DA SAPATA PRÉ-MOLDADA DEVERÁ SER FEITO COM CABOS A 90º EM RELAÇÃO AO PLANO SUPERIOR DA SUPERFICIE DA LAJE.

7 - SAPATA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, PESO 65 kN 3

8 - PARA RC (RABICHO DE LIGAÇÃO Á MALHA DE ATERRAMENTO GERAL) - VER DETALHE 11 NO DESENHO NOVO-SREL-PE-0003.

9 - ANTES DE REALIZAR A CONCRETAGEM, VERIFICAR PONTOS DE CONEXÃO E DETALHES DE ATERRAMENTO PARA SUPORTES DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME DESENHO NOVO-SREL-PE-0003

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
3	REVISÃO ONDE INDICADO / EMITIDO PARA CONSTRUÇÃO	22-08-18	A.C.T.	M.P.R.	E.R.P.
2	REVISÃO ONDE INDICADO / EMITIDO PARA CONSTRUÇÃO	30-07-18	J.K.Y.	M.P.R.	E.R.P.
1	REVISÃO ONDE INDICADO / EMITIDO PARA CONSTRUÇÃO	17-07-18	J.K.Y.	M.P.R.	E.R.P.
0	EMISSÃO INICIAL / EMITIDO PARA CONSTRUÇÃO	22-06-18	G.P.V.	M.P.R.	E.R.P.

REVISÕES

CONTRATANTE: SIEMENS / AG ANDRADE GUTIERREZ / CONSÓRCIO AQU

ENGENHARIA SUBCONTRATADA: SENER

CLIENTE: **UTE GNA I** Gás Natural Açu S.A.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. NENHUMA EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO QUALQUER TERCEIRA, TOTAL OU PARCIAL DE TODO OU QUALQUER PARTE DO DOCUMENTO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO E POR ESCRITO DA SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
A FALTA DE RETORNO SOBRE TAL CONSENTIMENTO NÃO DEVE, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER INTERPRETADA COMO AUTORIZAÇÃO PARA USO DA INFORMAÇÃO.

No ARQUIVO CAD :	NOVO-SRCA-PC-0509-02 Rev 3
ESCALA :	
REFERÊNCIA :	P0Q27003
TAMANHO ORIGINAL	A1
PROJETO:	UTE GNA I PLANTA DE CICLO COMBINADO PORTO DO AÇU - RIO DE JANEIRO
No DESENHO SUBCONTRATADA:	NOVO-SRCA-PC-0509
No DESENHO CLIENTE:	
No DESENHO SAG:	BR1045-30710-&CLB020-102139
TÍTULO DO DESENHO:	FUNDAÇÃO DO SISTEMA DE DOSAGEM *DOSING SYSTEM FOUNDATION - FORMS/STEEL REINFORCEMENT* SC.1 e SC.2-FORMAS e ARMADURAS
FL.	02
PRÓX.	03

DIN A1 (841 x 594)

0 100 200 300 mm
